UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°2 - Unidad 3

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Mondino Juan

Comisión

Nº6

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Andrea Ramos

27 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 4

Consignas 5

Desarrollo

Consigna 1 6

Consigna 2 7

Consigna 3 8

Conclusión 9

Declaración de Transparencia en el uso de IA 10

Referencias 11

Trabajo Práctico N°02

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar herramientas de planificación y administración al proyecto de mejora del módulo de Comercialización de Ternium Argentina, propuesto en el Trabajo Práctico N.º 1. La propuesta busca mejorar el intercambio de información entre las distintas áreas de la empresa, facilitando la gestión de los pedidos, la consulta de la disponibilidad de productos y la coordinación de las fechas de entrega.

Para analizar la viabilidad y organizar el desarrollo del proyecto, se realizará un análisis FODA que permita identificar sus principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Además, se establecerá un objetivo general acompañado de metas cuantitativas que permitan evaluar los resultados esperados. Por último, se elaborará un diagrama de Gantt para organizar las tareas, definir los plazos y asignar responsables.

De esta manera, se busca aplicar los conceptos de planeación estratégica y operativa, utilizando herramientas que permitan organizar el trabajo, anticipar dificultades y orientar el desarrollo del software hacia los objetivos propuestos.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Analizar la viabilidad del proyecto de mejora del módulo de Comercialización de Ternium Argentina mediante la elaboración de una matriz FODA.
- Definir un objetivo general claro y establecer metas cuantitativas que permitan evaluar los resultados esperados del sistema.
- Organizar las tareas necesarias para el desarrollo del software mediante un diagrama de Gantt, estableciendo plazos, precedencias y responsables.
- Aplicar herramientas de planeación estratégica y operativa para anticipar posibles dificultades, optimizar los recursos disponibles y facilitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Consigna 1

Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

Consigna 2

Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

Consigna 3

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1

Matriz FODA – Proyecto de Software (Ternium)

Mejora del módulo de Comercialización – Ternium Argentina

FORTALEZAS

Factores internos positivos

- El proyecto tiene una finalidad concreta: mejorar la gestión comercial y el intercambio de información.
- La propuesta identifica las áreas con las que debe integrarse el módulo.
- Puede aprovechar los sistemas de información y los datos que ya utiliza la empresa, si se dispone de acceso e integración adecuados.
- Permitiría centralizar información sobre pedidos, stock y entregas, facilitando el trabajo coordinado.

DEBILIDADES

Factores internos negativos

- Limitación inicial en la disponibilidad de un equipo de desarrollo dedicado exclusivamente a la implementación del proyecto dentro de la estructura actual.
- La integración con varios sectores y sistemas puede aumentar la complejidad del desarrollo.
- Será necesario disponer de información correcta y actualizada para evitar errores en pedidos y entregas.
- La implementación requerirá capacitación del personal y adaptación a nuevas formas de trabajo.

OPORTUNIDADES

Factores externos favorables

- La creciente utilización de herramientas digitales en las operaciones comerciales permite impulsar mejoras en la gestión.
- La necesidad de recibir información rápida y precisa sobre pedidos y entregas favorece este tipo de soluciones.
- La digitalización puede facilitar la coordinación entre la empresa, sus clientes y su cadena de distribución.
- Ternium ya cuenta con Ternium Activo, una plataforma digital para consultas y compras en línea, lo que demuestra un entorno favorable para los servicios comerciales digitales.

AMENAZAS

Factores externos desfavorables

- Los cambios tecnológicos pueden exigir actualizaciones o adaptaciones del sistema.
- Los incidentes de ciberseguridad podrían comprometer información comercial y datos de clientes.
- Las interrupciones de los sistemas o de la conectividad podrían dificultar el acceso a información actualizada.
- Los cambios en las condiciones del mercado y en las necesidades de los clientes podrían requerir modificaciones del proyecto.

Consigna 2

Objetivo general

Desarrollar e implementar una mejora del módulo de Comercialización de Ternium Argentina que permita centralizar la información de los pedidos, consultar la disponibilidad de productos y coordinar las fechas de entrega con las áreas de Producción, Inventario, Logística y Distribución, Administración y Finanzas y Sistemas de Información. De esta manera, se busca mejorar la organización del trabajo, reducir errores en el manejo de la información y brindar respuestas rápidas y precisas a los clientes.

Metas cuantitativas

Para evaluar el cumplimiento del objetivo general, se establecen las siguientes tres metas:

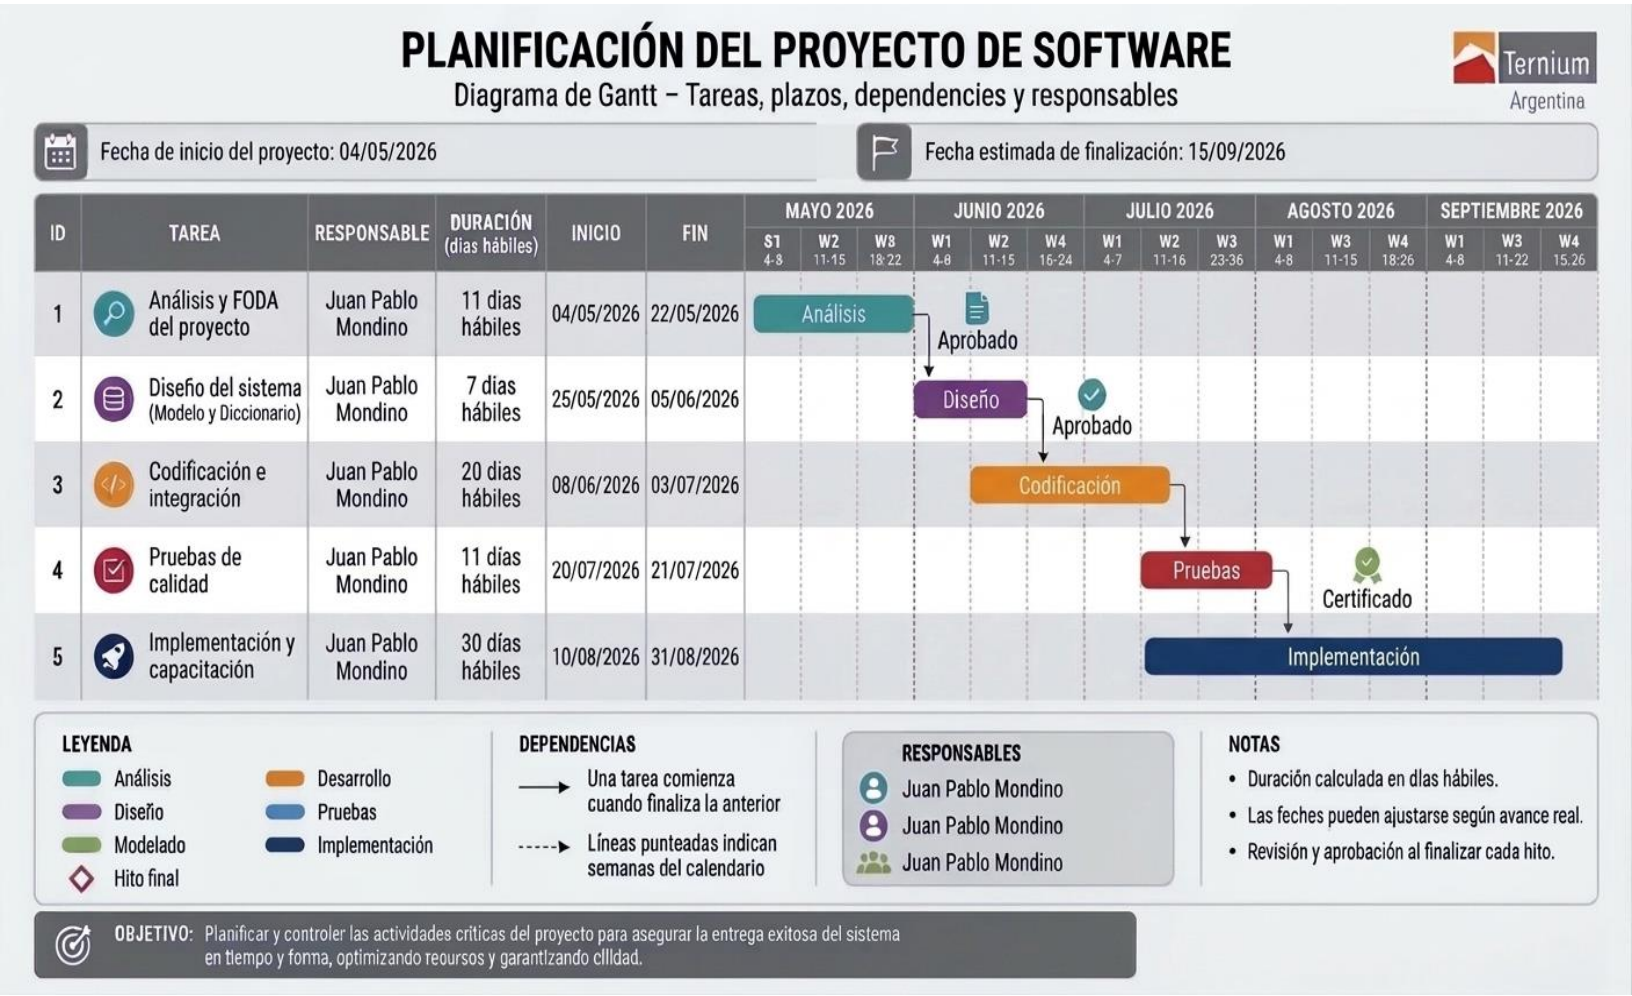
Meta 1: Tiempo de respuesta. Lograr que el sistema responda a las consultas sobre pedidos y disponibilidad de productos en un máximo de 3 segundos, facilitando el acceso rápido a la información.

Meta 2: Capacidad de gestión de registros. Permitir la carga y consulta de al menos 10.000 registros de pedidos, sin pérdida de información ni errores.

Meta 3: Plazo de desarrollo e implementación. Completar las etapas de análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación del módulo en un plazo máximo de 16 semanas, desde el inicio del proyecto.

Los valores establecidos son metas propuestas para la planificación del proyecto. Su cumplimiento deberá comprobarse mediante pruebas durante el desarrollo y antes de la implementación final.

Consigna 3


PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE
Diagrama de Gantt – Tareas, plazos, dependencies y responsables
Ternium
Argentina
Fecha de inicio del proyecto: 04/05/2026
Fecha estimada de finalización: 15/09/2026
ID
TAREA
RESPONSABLE
DURACIÓN (dias hábiles)
INICIO
FIN
MAYO 2026
JUNIO 2026
JULIO 2026
AGOSTO 2026
SEPTIEMBRE 2026
1 Análisis y FODA del proyecto Juan Pablo Mondino 11 dias hábiles 04/05/2026 22/05/2026
2 Diseño del sistema (Modelo y Diccionario) Juan Pablo Mondino 7 dias hábiles 25/05/2026 05/06/2026
3 Codificación e integración Juan Pablo Mondino 20 dias hábiles 08/06/2026 03/07/2026
4 Pruebas de calidad Juan Pablo Mondino 11 días hábiles 20/07/2026 21/07/2026
5 Implementación y capacitación Juan Pablo Mondino 30 días hábiles 10/08/2026 31/08/2026
Análisis
Aprobado
Diseño
Aprobado
Codificación
Pruebas
Certificado
Implementación
LEYENDA
Análisis
Diseño
Modelado
Hito final
Desarrollo
Pruebas
Implementación
DEPENDENCIAS
Una tarea comienza cuando finaliza la anterior
Líneas punteadas indican semanas del calendario
RESPONSABLES
Juan Pablo Mondino
Juan Pablo Mondino
Juan Pablo Mondino
NOTAS
Duración calculada en dlas hábiles.
Las feches pueden ajustarse según avance real.
Revisión y aprobación al finalizar cada hito.
OBJETIVO: Planificar y controler las actividades criticas del proyecto para asegurar la entrega exitosa del sistema en tlempo y fonma, optimizando reoursos y garantlzando clllidad.

Conclusión

A través de este trabajo se pudo analizar y planificar el proyecto de mejora del módulo de Comercialización de Ternium Argentina, considerando los factores que pueden influir en su desarrollo y los resultados que se espera alcanzar.

El análisis FODA permitió identificar aspectos internos y externos que deben tenerse en cuenta para llevar adelante el proyecto. El objetivo general y las metas cuantitativas establecieron una orientación clara para el desarrollo del sistema, mientras que el diagrama de Gantt permitió organizar las principales tareas, sus plazos y los responsables de cada etapa.

En conclusión, la aplicación de estas herramientas de administración permite planificar el proyecto de manera más ordenada, anticipar dificultades y realizar un seguimiento de su avance. Una adecuada planificación puede contribuir a que la mejora propuesta facilite el intercambio de información entre las áreas de la empresa, reduzca errores y permita brindar una mejor atención a los clientes.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En la elaboración de este trabajo se utilizó la asistencia de Inteligencia Artificial con el propósito de mejorar el estilo de la presentación y colaborar en la representación del diagrama de los diagramas de las consignas 1 y 3.

Referencias

1- *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Apuntes Unidad 2: Tema 1- Organización y Empresa* (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

2- *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Apuntes Unidad 4: Tema 2-Herramientas de Administración* (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

3- *Url de Siderar/Ternium: https://ar.ternium.com/es*
